Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad 2. El producto backlog

Producto Backlog:

https://trello.com/invite/b/6a9ce8db5ca9396e3fbfcbe7/ATTI1e5e28584b10d81dff1cce06ad6aa01765FC6514/product-backlog


Formato para el backlog

Product backlog:

Elaborado por: Mario Sosa Serrano

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
US-01	Como usuario, quiero navegar por un catálogo estructurado con categorías para encontrar productos fácilmente.	Catálogo y Navegación	Por hacer	5	Sprint 1	Alta	Base esencial para la experiencia de usuario.
US-02	Como comprador, quiero ver el detalle, precio, imágenes y stock de cada producto para tomar una decisión de compra.	Detalle de Producto	Por hacer	3	Sprint 1	Alta	Requerido para alimentar el carrito de compras.
US-03	Como comprador, quiero agregar, modificar y eliminar artículos de un carrito de	Carrito de Compras	Por hacer	8	Sprint 1	Muy Alta	Componente crítico del

	compras para gestionar mi pedido.						flujo transaccional.
US-04	Como cliente, quiero seleccionar mi método de pago (tarjeta/transferencia) y completar la transacción de forma segura.	Pasarela de Pago	Por hacer	5	Sprint 2	Media	Integración con API de pagos seguros.
US-05	Como usuario registrado, quiero ver el historial y estado de mis pedidos para hacer seguimiento a mi entrega.	Historial de Pedidos	Por hacer	8	Sprint 2	Muy Alta	Funcionalidad de fidelización y seguimiento.

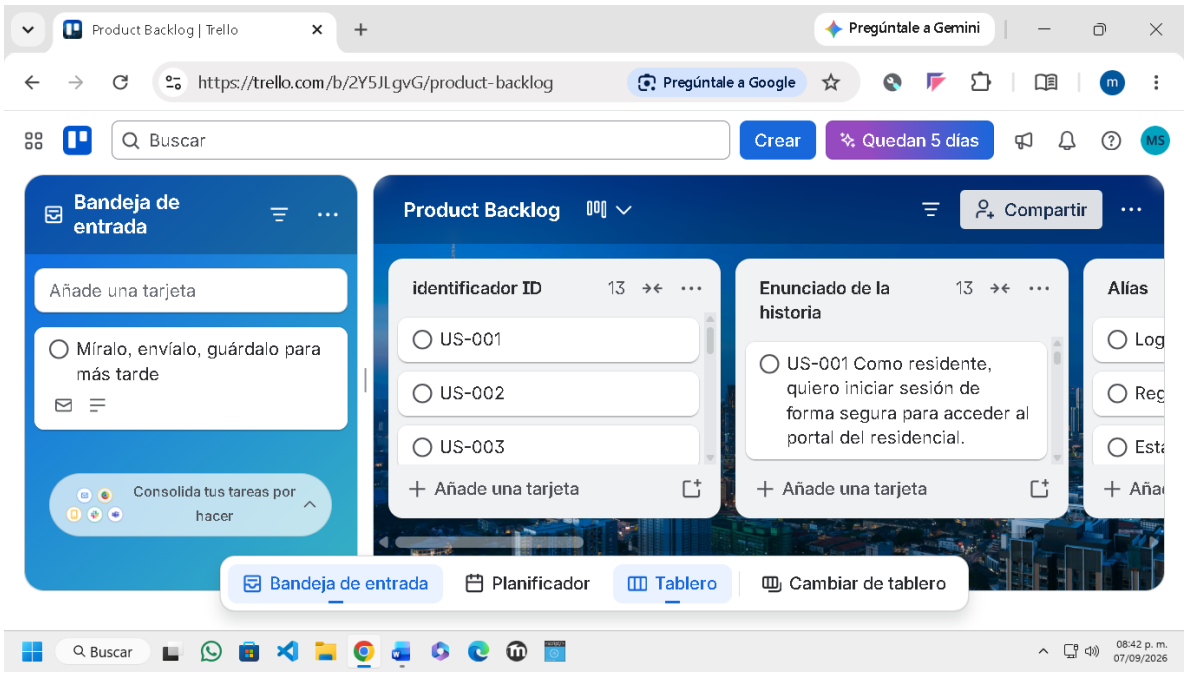

Sprint Backlog:

https://trello.com/invite/b/6a9f5df3cfbd16e754ebbe1c/ATTI93927110722d30515209865b5c9983e3C9A44CCF/sprint-backlog

Formato de Sprint - Sprint 1


Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID de la historia #1: US-01 - Catálogo y Navegación	5	Equipo Dev	En progreso	16 hrs	16	12	6	2	0	Completado / Demostrado

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Tarea 1.1: Diseñar componentes de interfaz y categorías	-	Diseñador / Dev UI	Hecho	4 hrs	4	0	0	0	0	Renderizado de categorías listo
Tarea 1.2: Crear API/Endpoint de productos por categoría	-	Dev Backend	Hecho	4 hrs	4	2	0	0	0	Endpoint probado en Postman
Tarea 1.3: Conectar catálogo con base de datos	-	Dev Backend	Hecho	4 hrs	0	4	2	0	0	Consultas optimizadas
Tarea 1.4: Implementar filtros y barra de navegación	-	Dev Frontend	Hecho	4 hrs	0	2	4	2	0	Navegación fluida y funcional
ID de la historia #2: US-02 - Detalle de Producto	**3**	**Equipo Dev**	**En progreso**	**12 hrs**	**12**	**10**	**5**	**1**	**0**	**Completado / Demostrado**
Tarea 2.1: Maquetar vista de detalle (precio, stock, imágenes)	-	Dev Frontend	Hecho	3 hrs	3	0	0	0	0	Galería e información básica
Tarea 2.2: Crear servicio backend para obtener producto por ID	-	Dev Backend	Hecho	3 hrs	3	1	0	0	0	Consulta de stock en tiempo real
Tarea 2.3: Integrar componente visual con la API de producto	-	Dev Frontend	Hecho	3 hrs	0	3	2	0	0	Muestra imágenes y precio correcto

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Tarea 2.4: Pruebas unitarias de la vista de detalle	-	QA / Dev	Hecho	3 hrs	0	0	3	1	0	Validado control de stock agotado
ID de la historia #3: US-03 - Carrito de Compras	**8**	**Equipo Dev**	**En progreso**	**24 hrs**	**24**	**20**	**14**	**6**	**0**	**Completado / Demostrado**
Tarea 3.1: Diseñar estado global y estructura del carrito	-	Dev Frontend	Hecho	6 hrs	6	2	0	0	0	Persistencia local / Redux configurado
Tarea 3.2: Implementar lógica de agregar, modificar y eliminar	-	Dev Frontend	Hecho	6 hrs	0	6	3	0	0	Botones y cantidades funcionando
Tarea 3.3: Endpoint de cálculo de totales, subtotales e impuestos	-	Dev Backend	Hecho	6 hrs	0	4	5	2	0	Cálculo dinámico preciso
Tarea 3.4: Pruebas de integración del flujo del carrito	-	QA / Dev	Hecho	6 hrs	0	0	2	4	0	Validado escenarios de modificación
Total	**16 pts**	-	-	**52 hrs**	**52**	**42**	**25**	**9**	**0**	**Sprint Exitoso**

Notas de la asignación del Sprint:

Formato sprint

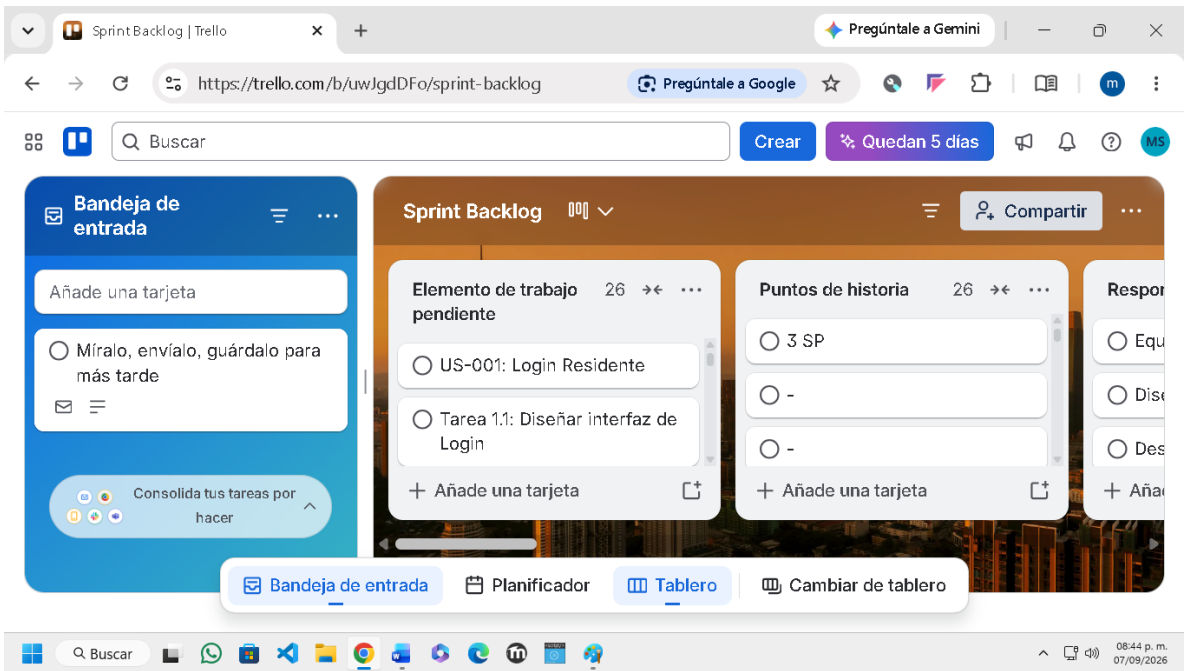

Durante la realización de estos ejercicios, aprendí a estructurar un Sprint Backlog conectando las Historias de Usuario con tareas técnicas concretas de desarrollo, lo que me permitió comprender la importancia de la planificación iterativa e incremental en la metodología Scrum. Asimismo, comprendí cómo la estimación en puntos de historia se traduce en horas de esfuerzo diario, facilitando el seguimiento visual del progreso hacia la entrega de un incremento funcional del producto. Por otro lado, la principal dificultad radicó en descomponer adecuadamente cada historia en actividades específicas de frontend, backend y QA sin omitir pasos clave, así como en distribuir las horas de trabajo de manera equitativa a lo largo de los cinco días del Sprint para lograr un avance fluido y coordinado.

Referencias Bibliográficas:

- Smartsheet. (s.f.). Las mejores plantillas de Excel para la gestión ágil de proyectos. Recuperado de https://es.smartsheet.com/agile-project-management-excel-templates
- CECyT Digital Harbor. (6 abr. 2018). Ejemplo de Product Backlog (Taller Mecanico). [Archivo de video]. Recuperado de Smartsheet. (s.f.). Las mejores plantillas de Excel para la gestión ágil de proyectos. Recuperado de https://es.smartsheet.com/agile-project-management-excel-templates
- JorgeRuizAgile (11 ago. 2018). El Product Backlog de forma sencilla | Scrum. [Archivo de video]. Recuperado de
